PERÚ | Ministerio de Economía y Finanzas

SIAF-RP
Sistema Integrado de Administración Financiera de los Recursos Públicos

RESUMEN EJECUTIVO

Integración funcional y temporal del Cronograma AFSP

Análisis de fechas, dependencias y alertas de los siete sistemas

Dirigido a: Coordinación del Proyecto y Unidad de Coordinación del Proyecto (UCP)
Fuente: Cronograma AFSP – Integrado.mpp, guardado el 21/10/2026
Fecha: 22 de octubre de 2026

1 Resumen ejecutivo

92 %	44 %	12 %	12 %
Clasificadores y Catálogos	Programación	Gestión	Evaluación

VEREDICTO

El cronograma integrado, en su versión actual, no permite garantizar la integración funcional y temporal de los siete sistemas. Cada sistema tiene fechas razonables por separado. Sin embargo, no existe ningún vínculo de precedencia entre sus 307 actividades, y el análisis funcional detecta tres inversiones de secuencia que comprometen la operación integrada.

Cifras clave (archivo .mpp guardado el 21/10/2026):

- Horizonte: 11/09/2023 – 28/12/2029. El fin del proyecto lo fija Endeudamiento (segunda etapa).
- Avance ponderado por duración: Clasificadores y Catálogos 92 %, Programación 44 %, Gestión 12 %, Evaluación 12 %.
- 0 dependencias registradas, 304 de 307 tareas programadas manualmente, sin línea base, sin fecha de estado y sin hitos.
- 6 tareas vencidas al 99 % y 8 tareas que debieron iniciar y siguen en 0 %.
- 33 actividades marcadas como "No figura en PMO".

Alertas principales (detalle en el Cuadro 4):

1. **Crítica – Tesorería.** La Gestión de pagos se diseña desde el 20/04/2027, pero la Asignación de pago (cuota de pago) recién estará el 31/05/2028: **407 días** de brecha.
2. **Crítica – Abastecimiento → Presupuesto.** La Ejecución de gastos de bienes, servicios y obras termina el 31/07/2027, antes de que existan la orden de compra/servicio (01/10/2027) y la Conformidad (07/01/2028).
3. **Alta – Contabilidad.** El Cierre presupuestario, los Estados presupuestales y los Estados financieros se diseñan entre octubre de 2026 y junio de 2027, antes que la Ejecución presupuestaria (hasta 22/11/2027).
4. **Alta – Presupuesto.** El Administrador de Metas, dos clasificadores temáticos y cinco catálogos versión 2 terminan entre 6 y 71 días después del fin de la Formulación (19/01/2027).
5. **Alta – Contabilidad.** La última actualización del Catálogo de Eventos y Motor de Contabilización termina el 22/09/2028, pero siguen diseñándose procesos que generan asientos hasta el 28/12/2029.

Lo que la UCP debe decidir ahora:

- Ordenar que se registren en el .mpp las dependencias del Cuadro 3, se guarde una línea base y se defina una fecha de estado.
- Validar con los CAF las propuestas del Cuadro 5. La de mayor impacto es adelantar la cuota de pago de Tesorería 422 días o definir una versión mínima anterior a abril de 2027.
- Confirmar si los procesos de Evaluación contable de 2026–2027 se alimentarán del SIAF-SP actual (integración ya concluida) o del nuevo módulo de Ejecución.

2 Fuente, alcance y limitaciones

Se analizó el archivo editable **"Cronograma AFSP - Integrado.mpp"** (Microsoft Project, revisión 38, autor Carlos Munares, guardado el 21/10/2026). El encargo mencionaba el PDF "Integrado6", pero se usó el .mpp porque permite verificar precedencias, restricciones y modos de programación. Se revisaron las 374 filas.

Criterios aplicados:

- Se usaron solo las 307 actividades operativas (sin tareas resumen) para calcular fechas, para no confundir la fecha de una tarea resumen con la disponibilidad de un entregable.
- Se excluyeron las filas 141 y 142, que duplican a la 144 y la 145. También se excluyó la fila 133 ("C3 – Construcción de software"), que es un marcador vacío de 1 día.
- El sistema de cada actividad se tomó de la columna personalizada "Sistema" y el estado, de la columna "Estado UCP". Las fechas de corte para atrasos son las del 21/10/2026.
- Las brechas se expresan en días calendario.

Limitaciones que condicionan las conclusiones:

- **No hay dependencias documentadas.** Ninguna de las 374 filas tiene predecesoras. Por eso, todas las dependencias del Cuadro 3 son **dependencias funcionales propuestas que requieren validación** de los CAF y de la Coordinación.
- **Programación manual.** 304 de 307 actividades están en modo manual. Las fechas no se recalculan si una predecesora se mueve.
- **Sin línea base ni fecha de estado.** No se puede medir la variación entre lo planificado y lo real.
- **El cronograma mide el diseño funcional (MFD, componente C1).** La construcción del software (C3) no está programada. Por tanto, "fecha disponible" significa aquí la fecha prevista del MFD, no la puesta en producción (criterio confirmado el 22/10/2026).
- **Restricciones:** solo tres tareas tienen restricción. Las filas 165 y 170 tienen "No finalizar antes del 29/01/2027" y la fila 169, "No comenzar antes del 15/12/2026".

3 Estructura del cronograma y sistemas

Los siete sistemas aparecen con estas denominaciones en la columna "Sistema": Presupuesto, Inversiones, Abastecimiento, GFRH, Tesorería, Endeudamiento y Contabilidad. El cronograma se organiza en seis niveles: Proyecto AFSP (1) → bloque o macroproceso (1.1–1.5) → módulo → proceso → subproceso → procedimiento. Los niveles 5 y 6 solo existen en Endeudamiento. Además, hay un bloque de Aplicativos de uso común (9 actividades, sin sistema asignado), concluido al 100 % el 20/04/2026.

Sistema	Programación (módulos)	Gestión (módulos)	Evaluación (módulos)	Clasificadores y Catálogos (actividades)
Presupuesto	Programación multianual presupuestaria; Formulación y aprobación	Apertura del ejercicio; Programación de la ejecución; Modificaciones; Ejecución presupuestaria	Evaluación presupuestaria	55
Inversiones	Programación de inversiones SNPMGI	Gestión administrativa de inversiones	Gestión administrativa de inversiones (seguimiento, ex post, sostenibilidad)	2
Abastecimiento	Programación multianual de bienes, servicios y obras	Adquisiciones y otras formas de obtención; Almacén; Bienes, propiedad, planta y equipo	—	9
GFRH	Programación y formulación del presupuesto de ingresos del personal	Gestión de ingresos del personal; Planillas del sector público	—	6
Tesorería	Planeación financiera	Gestión de ingresos; Gestión de pagos; Gestión de liquidez	—	17
Endeudamiento	Programación de desembolsos y pago de obligaciones de deuda (PMEyPO)	Endeudamiento primera etapa (6 módulos); segunda etapa (7 módulos)	—	16
Contabilidad	—	Servicios de contabilización	Servicios de contabilización (cierres, estados, consolidación, Cuenta General)	12

Observaciones de estructura:

- Cuatro sistemas (Abastecimiento, GFRH, Tesorería y Endeudamiento) no tienen procesos en el Macroproceso de Evaluación. Endeudamiento ubica sus "Estadísticas de deuda" en Gestión. Contabilidad no tiene procesos de Programación, lo cual es coherente con su naturaleza.
- Hay registros duplicados o con titular doble. "Formulación" y "Aprobación" aparecen en dos módulos (filas 141–142 y 144–145, con avance distinto: 0 % y 5 %). El "Catálogo de procesos de contratación" figura dos veces (filas 69 y 75). "Organismos financiadores" (Tesorería, fila 126) y "Clasificador de Acreedores" (Endeudamiento, fila 85) se refieren mutuamente con la palabra "antes".
- La columna "Estado UCP" no es consistente con el avance. 51 catálogos al 100 % dicen "MFD por crear en Administrador de Catálogo". Las filas 138, 144 y 168 dicen "Sin iniciar" con avance entre 5 % y 47 %. La fila 47 está al 100 % con fin el 28/12/2026 y estado "MFD en elaboración". La fila 81 se llama "<Tarea nueva>".

- Algunas tareas resumen distorsionan la lectura. El "Módulo de Gestión de almacén" abarca del 01/10/2025 al 11/12/2029 porque incluye el Inventario masivo ya concluido (2025–2026). Su trabajo pendiente se concentra en 2029.

4 Análisis de fechas

Clasificadores y Catálogos está casi concluido (92 %), pero Gestión y Evaluación apenas empiezan (12 %). La integración se decidirá entre 2027 y 2028. Las fechas salen de las actividades operativas; el porcentaje es el avance ponderado por duración.

Cuadro 1. Matriz consolidada de fechas por sistema y macroproceso

Sistema	Programación: inicio / fin (avance)	Gestión: inicio / fin (avance)	Evaluación: inicio / fin (avance)	Clasificadores y Catálogos: inicio / fin (avance)	Estado de integración
Presupuesto	07/09/2026 / 15/06/2027 (12 %)	22/03/2027 / 22/11/2027 (0 %)	04/10/2027 / 24/03/2028 (0 %)	13/10/2023 / 31/03/2027 (89 %)	Con brechas: metas y clasificadores terminan después de la Formulación
Inversiones	22/12/2025 / 30/06/2027 (47 %)	04/01/2027 / 30/08/2027 (0 %)	01/08/2027 / 29/01/2028 (0 %)	14/08/2026 / 22/01/2027 (22 %)	En riesgo: PMI en StandBy y formulación de proyectos después de la Formulación presupuestaria
Abastecimiento	14/09/2026 / 13/05/2027 (44 %)	01/10/2025 / 11/12/2029 (13 %)	Sin procesos	16/10/2023 / 16/06/2026 (100 %)	Desalineado: OC/OS y Conformidad después de la Ejecución de gastos de bienes y servicios
GFRH	15/09/2025 / 11/06/2026 (100 %)	27/10/2025 / 30/09/2026 (100 %)	Sin procesos	24/11/2025 / 28/12/2026 (70 %)	Adelantado: su integración con Ejecución y Pagos no se podrá probar hasta 2027
Tesorería	16/03/2026 / 31/05/2028 (43 %)	24/07/2026 / 31/05/2028 (9 %)	Sin procesos	18/09/2023 / 31/08/2026 (100 %)	Crítico: cuota de pago programada después de la Gestión de pagos
Endeudamiento	01/07/2026 / 29/01/2027 (57 %)	01/12/2026 / 28/12/2029 (0 %)	Sin procesos	18/09/2023 / 31/12/2026 (97 %)	Brecha menor con la Formulación (10 días); fija el fin del proyecto
Contabilidad	Sin procesos	29/10/2025 / 22/09/2028 (72 %)	13/03/2026 / 16/09/2028 (18 %)	11/09/2023 / 21/10/2027 (94 %)	Secuencia invertida: Evaluación antes que la Gestión de otros sistemas

Cuadro 2. Fechas extremas por macroproceso

Macroproceso	Inicio más temprano	Fin más tardío	Sistemas involucrados	Observaciones
Clasificadores y Catálogos	11/09/2023	21/10/2027	Los siete	117 actividades, 92 %. Lo pendiente es sobre todo de Presupuesto (Formulación 2027) y los catálogos de consolidación contable.
Programación	15/09/2025	31/05/2028	Seis (todos menos Contabilidad)	26 actividades, 44 %. El fin lo fija la cuota de pago de Tesorería. Sin ella, Programación terminaría el 30/06/2027.
Gestión	01/10/2025	28/12/2029	Los siete	133 actividades, 12 %. Endeudamiento aporta 59 de ellas (44 %) y define el fin con el "Registro manual de cronograma de servicio" (fila 296).
Evaluación	13/03/2026	16/09/2028	Contabilidad, Inversiones y Presupuesto	22 actividades, 12 %. Termina 468 días antes que Gestión. Lo que Endeudamiento y Abastecimiento diseñen en 2029 no tiene evaluación prevista.

Implicancias:

- **Programación y Gestión se solapan en todos los sistemas**, con excepción de GFRH. Eso es viable si la integración es progresiva, pero solo funciona si se documenta qué entregable parcial habilita a cada proceso receptor.
- **El ciclo presupuestario 2027 es el punto de convergencia.** Formulación (14/10/2026–19/01/2027) y Aprobación (16/11/2026–05/02/2027) dependen de insumos de Presupuesto, Inversiones, Tesorería y Endeudamiento que terminan después.
- **El tramo 2028–2029 queda fuera del ciclo de integración.** Endeudamiento (segunda etapa) y Abastecimiento (almacén y regímenes especiales) se diseñan después de la última actualización del motor contable y del fin de Evaluación.

5 Dependencias funcionales y temporales

De 22 dependencias identificadas, 3 tienen riesgo crítico y 8 riesgo alto. Ninguna está registrada en el .mpp: **todas son dependencias funcionales propuestas que requieren validación**.

Cómo leer el cuadro:

- La **fecha requerida** es el inicio del proceso receptor. Cuando el entregable se necesita para cerrar el diseño del receptor, se usa su fin; en ese caso se indica "(fin)".
- La **fecha disponible** es el fin del proceso origen.
- La **brecha** es la disponible menos la requerida. Un valor positivo es un atraso; uno negativo es holgura.
- Las filas del .mpp van entre paréntesis.

Cuadro 3. Matriz de dependencias funcionales y temporales

N.°	Sistema origen	Macroproceso / proceso origen	Entregable requerido	Sistema destino	Macroproceso / proceso dependiente	Fecha requerida	Fecha disponible	Brecha (días)	Riesgo
D1	Tesorería	Programación: Asignación de pago y Flujos de caja diarios (162–163)	Cuota de pago y cronograma de pagos	Tesorería	Gestión: Gestión de pagos (232, 234, 236)	20/04/2027	31/05/2028	+407	🔴 Crítico
D2	Abastecimiento	Gestión: Generación de contrato, OC y OS (196)	Documento de compromiso (contrato u orden)	Presupuesto	Gestión: Ejecución de gastos de bienes, servicios y obras (181)	01/06/2027	01/10/2027	+122	🔴 Crítico
D3	Abastecimiento	Gestión: Conformidad (197)	Conformidad para el devengado	Presupuesto	Gestión: Ejecución de gastos de bienes, servicios y obras (181)	31/07/2027 (fin)	07/01/2028	+160	🔴 Crítico
D4	Presupuesto	Gestión: Ejecución presupuestaria y Modificaciones (177, 180)	Ejecución y modificaciones del año	Contabilidad	Evaluación: Estados presupuestales y Cierre presupuestario (359–360)	01/10/2026	22/11/2027	+417	🟡 Alto (salvo que se use el SIAF-SP)
D5	Presupuesto, Tesorería y Endeudamiento	Gestión: Ejecución, pagos y operaciones de deuda	Transacciones que generan asientos	Contabilidad	Evaluación: Integrar información contable y Estados financieros (355, 358)	08/02/2027	22/11/2027	+287	🟡 Alto
D6	Siete sistemas	Gestión: procesos de 2028–2029 (Endeudamiento etapa 2, almacén, regímenes especiales)	Eventos contables nuevos	Contabilidad	Gestión: Actualización 2 de Catálogo de Eventos y Motor (347)	28/12/2029 (fin del diseño)	22/09/2028	462 días sin cobertura	🟡 Alto
D7	Inversiones	Programación: Formulación multianual del presupuesto de cada proyecto (150)	Presupuesto por proyecto	Presupuesto	Programación: Formulación del presupuesto (144)	19/01/2027 (fin)	30/06/2027	+162	🟡 Alto (confirmar ciclo)

N.°	Sistema origen	Macroproceso / proceso origen	Entregable requerido	Sistema destino	Macroproceso / proceso dependiente	Fecha requerida	Fecha disponible	Brecha (días)	Riesgo
D8	Presupuesto	Programación: Administrador de Metas (140)	Metas presupuestarias	Presupuesto	Programación: Formulación del presupuesto (144)	19/01/2027 (fin)	22/03/2027	+62	Alto
D9	Presupuesto	Catálogos: Clasificadores de Cambio Climático y Pueblos Indígenas (49–50)	Clasificadores temáticos	Presupuesto	Programación: Formulación (144)	19/01/2027 (fin)	31/03/2027	+44 a +71	Alto
D10	Presupuesto	Catálogos versión 2 y Relación Actividad por Finalidad (128–132)	Estructura programática 2027	Presupuesto	Programación: Formulación (144)	19/01/2027 (fin)	05/03/2027	+6 a +45	Alto
D11	Inversiones	Programación: Elaboración de la PMI y PMIE (147, StandBy, 62 %)	Programa multianual de inversiones	Inversiones	Programación: Registro de estructura del proyecto (149)	01/12/2026	30/11/2026	−1	Alto (StandBy)
D12	Endeudamiento	Gestión: Compromiso y devengado del servicio de deuda (269)	Instrucciones de pago de deuda	Presupuesto	Gestión: Ejecución de gastos de operaciones de endeudamiento (186)	15/10/2027 (fin)	25/11/2027	+41	Medio
D13	Presupuesto	Gestión: Ejecución presupuestaria (180)	Ejecución del gasto	Presupuesto	Evaluación: Seguimiento de metas físicas y financieras (366–367)	04/10/2027	22/11/2027	+49	Medio
D14	Endeudamiento / Inversiones	Catálogos: Catálogo relacional Deuda Inversión (82, "Por actualizar")	Relación deuda–proyecto	Inversiones y Endeudamiento	Registro de estructura del proyecto (149); Concertación (256)	01/12/2026	31/12/2026	+30	Medio
D15	Inversiones	Gestión: Gestión administrativa de inversiones (188)	Ejecución de convenios y desembolsos	Inversiones	Evaluación: Seguimiento físico y financiero (350)	01/08/2027	30/08/2027	+29	Medio
D16	Abastecimiento	Programación: CMN Programación (153) y PAC (155)	Cuadro multianual de necesidades y PAC	Abastecimiento	Gestión: Actuaciones preparatorias (195)	12/01/2027	25/01/2027	+13	Medio
D17	Endeudamiento	Programación: Proyección del servicio de la deuda (167, 169)	Servicio de deuda proyectado	Presupuesto	Programación: Formulación (144)	19/01/2027 (fin)	29/01/2027	+10	Medio
D18	Tesorería	Programación: Recursos por OOC, RO y RD (160, 2 %)	Estimación de ingresos por fuente	Presupuesto	Programación: Formulación (144)	19/01/2027 (fin)	29/01/2027	+10	Medio
D19	Contabilidad	Catálogos: Agregación y Consolidación presupuestal y contable (108–109)	Reglas de consolidación	Contabilidad	Evaluación: Consolidación presupuestal y contable (356–357)	15/10/2027	21/10/2027	+6	Bajo
D20	Presupuesto	Gestión: Cuotas de compromiso (175–176, "Por validar")	Cuotas de compromiso	Presupuesto	Gestión: Ejecución presupuestaria (180)	01/06/2027	31/05/2027	−1	Bajo
D21	Presupuesto	Programación: Formulación y Aprobación (144–145)	Presupuesto aprobado	Presupuesto	Gestión: Apertura del ejercicio (173)	22/03/2027	05/02/2027	−45	Bajo
D22	GFRH	Gestión: Planillas del sector público (216)	Planilla para el compromiso y el pago	Presupuesto y Tesorería	Gestión: Ejecución de gastos de gestión fiscal (182); Gestión de pagos	16/06/2027	30/09/2026	−259	Bajo (prueba integrada tardía)

Solapamientos viables con entregas parciales: D13, D15, D16, D19 y D20. En estos casos basta con definir una versión funcional mínima del origen que habilite al receptor. No requieren cambiar fechas, pero sí registrar el vínculo con un desfase.

Inversiones de secuencia que no se resuelven con entregas parciales: D1, D2, D3, D4 y D5. El receptor termina su diseño antes de que exista el diseño del origen.

6 Alertas de integración

Se identifican 19 alertas: 2 críticas, 5 altas, 8 medias y 4 bajas. Solo se califica como crítica una alerta cuando el proceso receptor cierra su diseño antes de que exista el insumo y no hay entrega parcial posible. Un simple solapamiento de fechas no basta.

Cuadro 4. Alertas de integración

N.°	Sistema	Macroprocesos involucrados	Hallazgo	Evidencia del cronograma	Impacto	Nivel de alerta	Acción requerida
1	Tesorería	Programación → Gestión	La cuota de pago se diseña después de los procesos de pago que la usan.	Asignación de pago (163): 01/05/2028–31/05/2028. Flujos de caja diarios (162): 01/03/2028–28/04/2028. Gestión de pagos: desde 20/04/2027 (232); Entre CUT (236) y Operativización del pago (234) terminan en septiembre de 2027.	Los MFD de pagos se cierran sin la regla que habilita el pago. Habrá retrabajo y no se podrá probar el ciclo compromiso–devengado–pago.	Crítica	Adelantar 162–163 (Cuadro 5, ajuste 1) o definir una cuota de pago mínima antes del 20/04/2027.
2	Abastecimiento y Presupuesto	Gestión ↔ Gestión	El diseño de la ejecución del gasto de bienes y servicios termina antes que el contrato, la orden y la conformidad.	Ejecución de gastos de bienes, servicios y obras (181): 01/06/2027–31/07/2027. Generación de contrato, OC y OS (196): 14/05/2027–01/10/2027. Conformidad (197): 01/09/2027–07/01/2028.	El compromiso y el devengado de bienes y servicios, la mayor parte del gasto corriente, se diseñan sin su documento fuente.	Crítica	Reprogramar 181 en dos entregas, compromiso y devengado (Cuadro 5, ajuste 2), y vincularlas con 196 y 197.
3	Transversal	Los cuatro	El cronograma no puede demostrar la integración porque no tiene lógica de red.	0 predecesoras en 374 filas; 304 de 307 tareas en modo manual; sin línea base, fecha de estado, hitos ni recursos. La construcción del software (fila 133) es un marcador de 1 día.	No hay ruta crítica. Un atraso no se propaga, y la puesta en producción no tiene fecha.	Alta	Registrar los vínculos del Cuadro 3, pasar las tareas a modo automático, guardar una línea base y programar el C3 por sistema.
4	Contabilidad	Gestión → Evaluación	Los cierres y estados se diseñan antes que la ejecución que deben reflejar.	Estados presupuestales y Cierre presupuestario (359–360): 01/10/2026–06/02/2027, en 0 % a pesar de que debieron iniciar. Estados financieros (358): hasta 08/06/2027. Ejecución presupuestaria (180): hasta 22/11/2027.	Si la fuente es el nuevo módulo de Ejecución, habrá rediseño. Si es el SIAF-SP (integración 344 concluida), es viable, pero se debe documentar.	Alta	Confirmar la fuente de datos. Si es el nuevo módulo, aplicar el Cuadro 5, ajuste 6.
5	Contabilidad	Gestión (todos los sistemas)	El motor contable no se actualiza para los procesos diseñados después de septiembre de 2028.	Actualización 2 de Catálogo de Eventos y Motor (347): fin 22/09/2028. Endeudamiento etapa 2 incluye "Ajustes contables – Diferencia de cambio" (332, 2029) y "Carga financiera devengada" (327, 2029). Gestión de almacén: 2029.	Operaciones de deuda y almacén sin eventos contables definidos.	Alta	Agregar una Actualización 3 del motor, posterior al 28/12/2029 o por entregas anuales.
6	Presupuesto	Catálogos y Programación	Las metas, los clasificadores temáticos y la estructura programática 2027 terminan después de la Formulación.	Administrador de Metas (140, "Por validar"): fin 22/03/2027. Cambio Climático (49): 04/03/2027. Pueblos Indígenas (50): 31/03/2027. Catálogos versión 2 (128–132, "No figura en PMO"): hasta 05/03/2027. Formulación (144): fin 19/01/2027.	La Formulación se diseña con estructuras incompletas; las versiones 2 no están en el alcance aprobado.	Alta	Adelantar o definir el ciclo de aplicación (Cuadro 5, ajustes 3 a 5). Incorporar las versiones 2 al PMO.

N.°	Sistema	Macroprocesos involucrados	Hallazgo	Evidencia del cronograma	Impacto	Nivel de alerta	Acción requerida
7	Inversiones	Programación ↔ Presupuesto	La cadena de programación de inversiones está detenida y desfasada del ciclo presupuestario.	PMI y PMIE (147): StandBy, 62 %, fin 30/11/2026; la fila 149 empieza el 01/12/2026. Formulación multianual por proyecto (150): 01/04/2027–30/06/2027. Catálogo de ciudad país (127): StandBy, 7 %.	Sin la PMI no hay estructura de proyectos para Presupuesto ni para Endeudamiento.	Alta	Decidir si se reactiva la PMI y confirmar a qué ciclo de formulación corresponde la fila 150.
8	Endeudamiento y Tesorería	Programación → Programación (Presupuesto)	Los insumos de deuda e ingresos llegan 10 días después del fin de la Formulación.	Proyección del servicio de deuda (167) y Consolidación (169): fin 29/01/2027. Recursos por OOC, RO y RD (160, 2 %): fin 29/01/2027. Las filas 165 y 170 tienen la restricción "No finalizar antes del 29/01/2027".	Brecha corta, que se puede cubrir con una entrega parcial.	Media	Entregar una versión preliminar al 15/01/2027 y revisar si la restricción se justifica.
9	Inversiones y Endeudamiento	Gestión	Hay procesos posiblemente duplicados sobre convenios y desembolsos.	Inversiones: Estructura de convenios (189) y Gestión de desembolsos (191). Endeudamiento: Registro de estructura de convenios (282) y Gestión de desembolsos (279). Todos entre enero y mayo de 2027. Catálogo relacional Deuda Inversión (82): "Por actualizar".	Doble diseño, o datos de convenios con dos fuentes.	Media	Definir un sistema titular y que el otro consuma el dato. Actualizar el catálogo 82 antes del 01/12/2026.
10	Presupuesto y Tesorería	Gestión	Procesos clave están fuera del alcance PMO.	33 actividades dicen "No figura en PMO", entre ellas las 7 de Ejecución presupuestaria (181–187) y 6 de las 9 de Gestión de pagos.	Riesgo de que no tengan presupuesto ni prioridad en la fábrica de software.	Media	Que la Coordinación decida si se incorporan al PMO.
11	Abastecimiento, GFRH, Tesorería y Endeudamiento	Evaluación	Estos cuatro sistemas no tienen procesos de Evaluación.	El Macroproceso de Evaluación solo tiene actividades de Contabilidad, Inversiones y Presupuesto, y termina el 16/09/2028, 468 días antes que Gestión.	La Evaluación no cubre deuda, liquidez, adquisiciones ni planillas.	Media	Confirmar si es una decisión de alcance o un faltante.
12	Presupuesto e Inversiones	Gestión → Evaluación	La Evaluación empieza antes de que termine el diseño de la Gestión que la alimenta.	Seguimiento de metas (366): desde 04/10/2027; la Ejecución (180) termina el 22/11/2027. Seguimiento físico y financiero (350): desde 01/08/2027; la Gestión administrativa (188) termina el 30/08/2027.	Viable con entregas parciales.	Media	Registrar los vínculos fin–comienzo con un desfase negativo y definir la versión mínima.
13	Endeudamiento y Presupuesto	Gestión	La ejecución de gastos de deuda termina antes que la emisión de instrucciones de pago.	Ejecución de gastos de operaciones de endeudamiento (186): fin 15/10/2027. Compromiso y devengado del servicio de deuda (269): fin 25/11/2027.	Desalineación de 41 días.	Media	Alinear el fin de 186 con el de 269, o al revés.
14	Transversal	Los cuatro	La calidad de los datos del cronograma es insuficiente para hacer seguimiento.	6 tareas vencidas al 99 % (25, 46, 59, 60, 62, 63). 8 tareas que debieron iniciar siguen en 0 % (48, 51, 81, 130, 250, 251, 359, 360). El Estado UCP no coincide con el avance (filas 47, 138, 144, 168). Hay duplicados (141–142, 69/75) y una "<Tarea nueva>" (81).	Los reportes de avance pueden inducir a error.	Media	Depurar el archivo antes de guardar la línea base.
15	Abastecimiento	Programación → Gestión	Las actuaciones preparatorias empiezan antes de que terminen el CMN y el PAC.	CMN Programación (153): fin 25/01/2027. PAC (155, "No figura en PMO"): fin 11/01/2027. Actuaciones preparatorias (195): inicio 12/01/2027.	Solapamiento de 13 días, viable de forma progresiva.	Media	Registrar los vínculos e incorporar el PAC al PMO.
16	GFRH	Gestión	GFRH concluyó entre 8 y 9 meses antes que sus receptores.	Planillas (216): fin 30/09/2026. Ejecución de gastos de gestión fiscal (182): desde 16/06/2027. Gestión de pagos: desde 20/04/2027.	La prueba integrada será tardía y podría exigir ajustes a diseños ya cerrados.	Baja	Que GFRH participe en la revisión de los MFD de 182 y de pagos.

N.°	Sistema	Macroprocesos involucrados	Hallazgo	Evidencia del cronograma	Impacto	Nivel de alerta	Acción requerida
17	Contabilidad	Catálogos → Evaluación	El catálogo de consolidación termina 6 días después del inicio de la Consolidación.	Catálogos 108–109: fin 21/10/2027. Consolidación (356–357): inicio 15/10/2027.	Menor.	Baja	Adelantar el fin 13 días o aceptar el solapamiento.
18	Presupuesto	Gestión	La Ejecución depende de las cuotas de compromiso con 1 día de margen.	Cuotas (175–176, "Por validar"): fin 31/05/2027. Ejecución (180): inicio 01/06/2027.	Cualquier atraso se traslada a la Ejecución.	Baja	Validar las cuotas y vincularlas.
19	Abastecimiento	Catálogos → Gestión	Los catálogos de almacén se concluyeron 939 días antes de usarse.	Catálogos 70–74: fin 16/06/2026. Logística de entrada (204): inicio 10/01/2029.	Riesgo de que queden desactualizados.	Baja	Prever una revisión de estos catálogos en 2028.

7 Ajustes necesarios del cronograma

Se proponen 12 ajustes. Siete adelantan predecesoras, tres retrasan procesos dependientes, uno agrega una actividad nueva y uno queda pendiente de decisión. Ninguno toca actividades completadas. Las fechas propuestas son calculables, pero **no están verificadas en viabilidad**: el .mpp no tiene recursos asignados, así que no se puede comprobar la capacidad de los CAF ni de la fábrica de software. Cada ajuste debe validarse antes de incorporarse.

Cuadro 5. Propuesta de ajustes del cronograma

N.°	Sistema	Proceso o actividad	Fecha actual	Fecha propuesta	Ajuste (días)	Justificación funcional	Impacto en otros sistemas	Prioridad	Tipo
1	Tesorería	Flujos de caja diarios (162) y Asignación de pago (163)	01/03/2028 – 31/05/2028	04/01/2027 – 05/04/2027 (162 hasta 03/03; 163 del 04/03 al 05/04)	−422	La cuota de pago debe existir antes del primer proceso de pagos (20/04/2027). Se conservan las duraciones en días calendario.	Programación termina el 30/06/2027 en lugar del 31/05/2028. Los procesos de Endeudamiento que liquidan y pagan ya contarán con la cuota. Se solapa con los Flujos de caja proyectados (161).	Alta	Requiere validación del CAF de Tesorería (carga simultánea con 160, 161, 245 y 249–251)
2	Presupuesto	Ejecución de gastos de bienes, servicios y obras (181): dividir en compromiso y devengado	01/06/2027 – 31/07/2027	Compromiso: 04/10/2027 – 03/12/2027. Devengado: 10/01/2028 – 10/03/2028	+125 / +223	Adelantar la OC/OS (196) y la Conformidad (197) no es viable porque dependen de las Actuaciones preparatorias (195), que terminan el 31/08/2027.	Mueve el fin del módulo de Ejecución al 10/03/2028. Afecta la Evaluación presupuestaria (hasta 24/03/2028) y los procesos contables de la fila 359.	Alta	Requiere decisión de la Coordinación y del CAF de Presupuesto
3	Presupuesto	Administrador de Metas (140)	01/12/2026 – 22/03/2027	26/10/2026 – 15/01/2027	−66 (fin)	Las metas deben estar antes del fin de la Formulación (19/01/2027).	Habilita la Formulación y la Aprobación. Sin impacto en otros sistemas.	Alta	Requiere validación: comprime la duración de unos 80 a unos 58 días hábiles
4	Presupuesto	Clasificadores de Cambio Climático (49) y Pueblos Indígenas (50)	Fin 04/03/2027 y 31/03/2027	26/10/2026 – 15/01/2027	−48 y −75 (fin)	Se usan para etiquetar el gasto desde la Formulación.	Ninguno directo.	Media	Requiere decisión: adelantar, o aplicarlos desde la Formulación 2028 y mantener las fechas
5	Presupuesto	Relación Actividad por Finalidad (132) y Programas Presupuestales v2 (128)	Fin 05/03/2027 y 25/01/2027	Fin 15/01/2027	−49 y −10	Forman parte de la estructura programática que usa la Formulación.	Ninguno directo.	Alta	Requiere incorporarlos al PMO y validar con el CAF
6	Contabilidad	Estados presupuestales y Cierre presupuestario (359–360)	01/10/2026 – 06/02/2027	23/11/2027 – 30/03/2028	+418	Solo aplica si la fuente es el nuevo módulo de Ejecución (fin 22/11/2027).	Se solapa 8 días con la Cuenta General (363, desde 22/03/2028). Retrasa la Consolidación presupuestal (356).	Alta	Requiere decisión: si la fuente es el SIAF-SP, mantener fechas y documentarlo


N.°	Sistema	Proceso o actividad	Fecha actual	Fecha propuesta	Ajuste (días)	Justificación funcional	Impacto en otros sistemas	Prioridad	Tipo
7	Contabilidad	Nueva: Actualización 3 de Catálogo de Eventos y Motor	No existe	03/09/2029 – 28/12/2029	Nueva	Cubre los eventos de Endeudamiento (etapa 2) y de Abastecimiento diseñados después del 22/09/2028.	Ninguno. Lo diseñado en septiembre–diciembre de 2029 requerirá una actualización posterior al horizonte.	Media	Requiere validación del CAF de Contabilidad
8	Endeudamiento y Tesorería	Proyección del servicio de deuda (167, 169, 170) y Recursos por OOC, RO y RD (160): entrega preliminar	Fin 29/01/2027	Versión preliminar al 15/01/2027	−14	Insumo de la Formulación (fin 19/01/2027).	Requiere levantar la restricción "No finalizar antes del 29/01/2027" en 165 y 170.	Media	Calculable. La fila 160 está al 2 % y necesita validación
9	Endeudamiento	Catálogo relacional Deuda Inversión (82)	02/11/2026 – 31/12/2026	02/11/2026 – 27/11/2026	−34 (fin)	Lo usan el Registro de estructura del proyecto (149) y la Concertación (256), que empiezan el 01/12/2026.	Habilita a Inversiones y Endeudamiento.	Media	Requiere validación (estado "Por actualizar")
10	Presupuesto	Ejecución de gastos de operaciones de endeudamiento (186)	16/08/2027 – 15/10/2027	16/08/2027 – 25/11/2027	+41 (fin)	Debe cerrar después de las instrucciones de pago de deuda (269).	El módulo de Ejecución termina 3 días después (25/11/2027) si no se aplica el ajuste 2.	Media	Calculable
11	Contabilidad	Catálogos de Agregación y Consolidación (108–109)	12/08/2027 – 21/10/2027	12/08/2027 – 08/10/2027	−13 (fin)	Deben estar listos antes de la Consolidación (15/10/2027).	Ninguno.	Baja	Calculable
12	Inversiones	PMI y PMIE (147) y Formulación multianual por proyecto (150)	147: fin 30/11/2026 (StandBy). 150: 01/04/2027 – 30/06/2027	No determinable	—	Falta saber si se reactiva la fila 147 y a qué ciclo de formulación corresponde la 150.	Condiciona las filas 149, 189 y 256 y la Formulación de Presupuesto.	Alta	Decisión necesaria de la Coordinación con el CAF de Inversiones

Efectos en cadena:

- **Los ajustes 1 y 2** cambian los extremos de dos macroprocesos. Programación termina el 30/06/2027. El módulo de Ejecución presupuestaria se extiende al 10/03/2028, lo que deja 14 días de margen con el fin de la Evaluación presupuestaria (24/03/2028).
- **Los ajustes 3, 4 y 5** comprimen trabajo en noviembre y diciembre de 2026 para el CAF de Presupuesto, que ya tiene 10 catálogos con avance parcial y 4 procesos de Programación en curso. Es la principal restricción de capacidad que se debe verificar.
- **El fin del proyecto (28/12/2029) no cambia** con ninguno de los ajustes propuestos.

8 Gráficos ejecutivos

Gráfico 1. Cronograma integrado por macroproceso y sistema

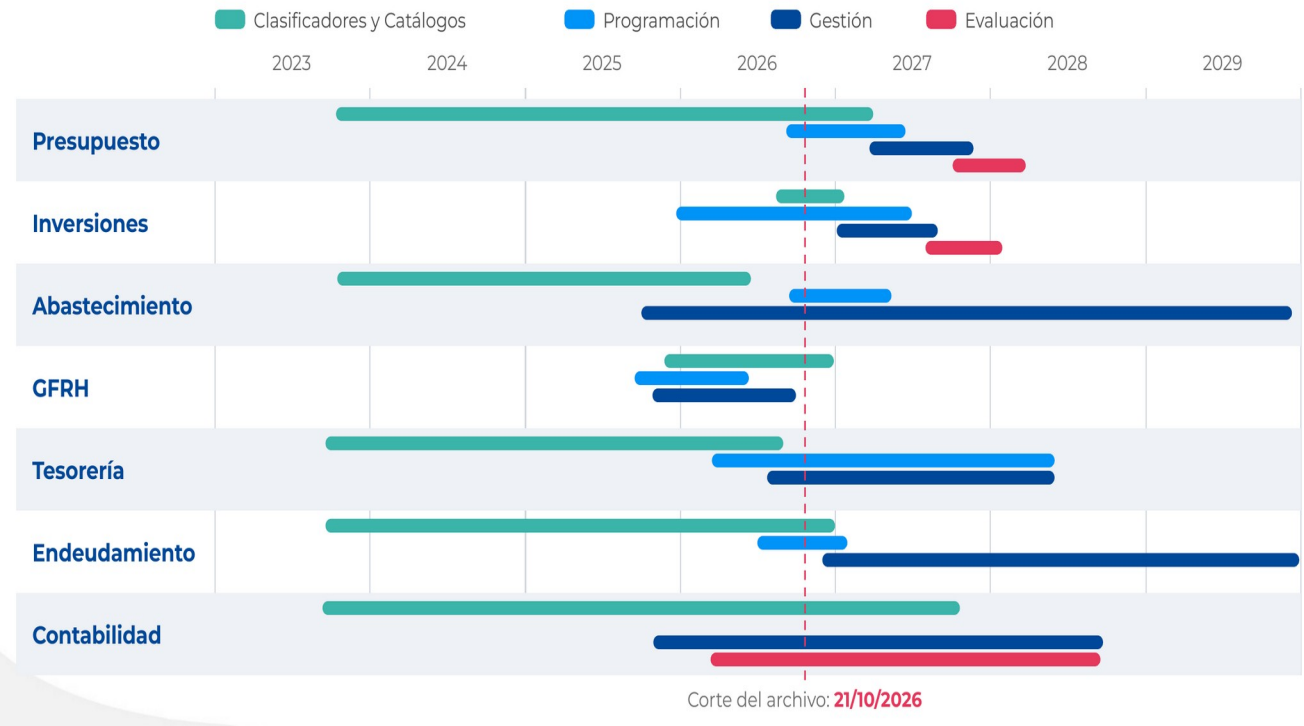

Los catálogos (2023–2027) preceden a todo. Programación, Gestión y Evaluación se superponen en 2027–2028 en cinco sistemas. La Gestión de Endeudamiento y de Abastecimiento continúa sola hasta 2029, sin Evaluación asociada.

Gráfico 2. Dependencias entre macroprocesos



Las flechas en rojo (1 y 2) marcan el ciclo del gasto, donde el proceso receptor se diseña antes que su insumo. Las ámbar (3 a 5) se resuelven adelantando insumos o con entregas parciales.

9 Conclusiones y decisiones requeridas

La integración es alcanzable sin mover el fin del proyecto (28/12/2029), pero el cronograma actual no la garantiza. Para eso hacen falta tres condiciones: corregir las dos alertas críticas, convertir el archivo en un cronograma con lógica de red y que la Coordinación tome cuatro decisiones de alcance.

Conclusiones:

1. **Clasificadores y Catálogos no es el cuello de botella.** Está al 92 %, y lo pendiente se concentra en Presupuesto para el ciclo de Formulación 2027.
2. **El ciclo presupuestario 2027 es el punto más frágil.** Cinco insumos de cuatro sistemas llegan después del fin de la Formulación (D7 a D10, D17 y D18).
3. **El diseño del ciclo del gasto no es secuencial entre sistemas.** El compromiso, el devengado y el pago se diseñan antes que sus documentos fuente: la OC/OS y la Conformidad de Abastecimiento, y la cuota de pago de Tesorería.
4. **Evaluación está incompleta y adelantada.** Cubre tres de los siete sistemas, y en Contabilidad se diseña antes que la Gestión que evalúa.
5. **El cronograma no sirve todavía como instrumento de control.** No tiene vínculos, línea base, fecha de estado ni fechas de construcción (C3).

Decisiones requeridas de la Coordinación y la UCP:

- ☐ Aprobar la reprogramación de la cuota de pago de Tesorería (Cuadro 5, ajuste 1) o una versión mínima anterior al 20/04/2027.
- ☐ Decidir cómo se diseña la ejecución de bienes, servicios y obras respecto de la OC/OS y la Conformidad (ajuste 2).
- ☐ Confirmar la fuente de datos de los cierres y estados contables de 2026–2027: SIAF-SP o nuevo módulo (ajuste 6).
- ☐ Definir si la PMI de Inversiones sale de StandBy y a qué ciclo corresponde la fila 150 (ajuste 12).
- ☐ Decidir si se incorporan al PMO las 33 actividades marcadas como "No figura en PMO".
- ☐ Confirmar si Abastecimiento, GFRH, Tesorería y Endeudamiento deben tener procesos de Evaluación.
- ☐ Definir un único sistema titular para los convenios, desembolsos y acreedores que comparten Inversiones, Endeudamiento y Tesorería.

Acciones técnicas sobre el archivo .mpp (responsable: PMO):

- ☐ Depurar los duplicados, la "<Tarea nueva>", el marcador C3 y las inconsistencias de Estado UCP (alerta 14).
- ☐ Registrar como vínculos las 22 dependencias del Cuadro 3, con desfase cuando se acepte un solapamiento.
- ☐ Pasar las tareas a programación automática, definir una fecha de estado mensual y guardar la línea base.
- ☐ Programar la construcción (C3) y la puesta en producción por sistema, para medir la disponibilidad real de cada entregable.
