PERÚ | Ministerio de Economía y Finanzas

SIAF-RP
Sistema Integrado de Administración Financiera de los Recursos Públicos

Integración funcional y temporal del Cronograma AFSP

Resumen ejecutivo para la Coordinación del Proyecto y la UCP

Análisis del archivo .mpp con corte al 21 de octubre de 2026

El cronograma no garantiza hoy la integración

Cada sistema tiene fechas razonables; la integración entre ellos no está planificada

VEREDICTO

Las fechas no aseguran que los siete sistemas operen integrados

Ninguna dependencia está registrada en el .mpp.

El ciclo del gasto se diseña en orden invertido.

El ciclo presupuestario 2027 recibe insumos tarde.

0

vínculos de precedencia entre 307 actividades

3

inversiones de secuencia en el gasto y la contabilidad

2

alertas críticas: Tesorería y Abastecimiento

28/12/2029

fin del proyecto; no cambia con los ajustes

Fuente: Cronograma AFSP – Integrado.mpp, guardado el 21/10/2026. Fechas de diseño funcional (MFD).

Avance por macroproceso

Los catálogos están casi listos; Gestión y Evaluación recién empiezan



92 %

Clasificadores y Catálogos

sep 2023 – oct 2027

117 actividades · 7 sistemas



44 %

Programación

sep 2025 – may 2028

26 actividades · 6 sistemas



12 %

Gestión

oct 2025 – dic 2029

133 actividades · 7 sistemas



12 %

Evaluación


mar 2026 – sep 2028

22 actividades · 3 sistemas

Avance ponderado por duración de las actividades operativas (sin tareas resumen). Fuente: Cronograma AFSP – Integrado.mpp, 21/10/2026.

Cronograma integrado por sistema

La integración se juega en 2027–2028; Endeudamiento lleva el fin del proyecto a 2029

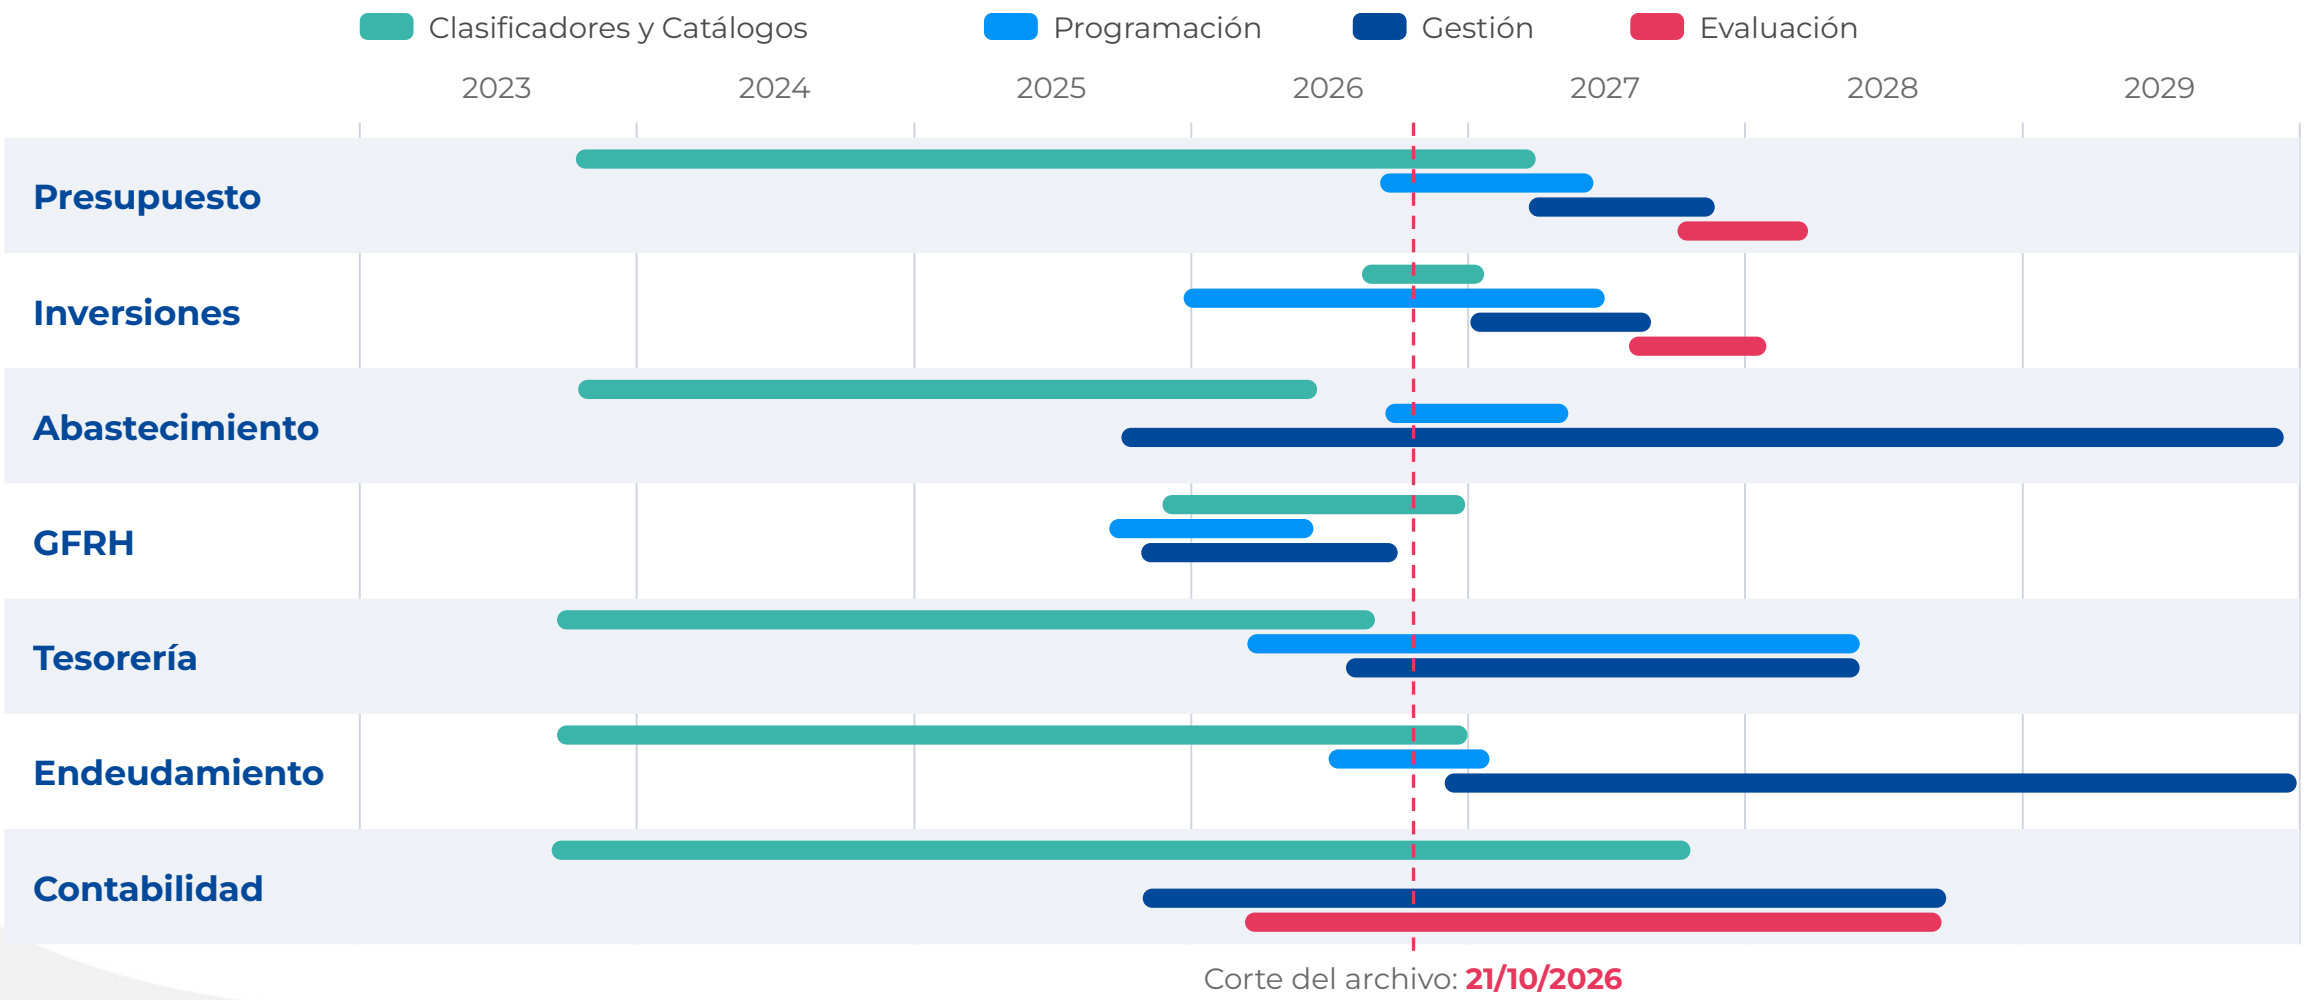

Fuente: Cronograma AFSP – Integrado.mpp, guardado el 21/10/2026. Fechas de diseño funcional (MFD).

Los siete sistemas en una mirada


Dos sistemas en estado crítico y tres en alto riesgo de integración

Sistema	Programación	Gestión	Evaluación	Catálogos	Estado de integración
Presupuesto	sep 2026 – jun 2027 **12 %**	mar – nov 2027 **0 %**	oct 2027 – mar 2028 **0 %**	oct 2023 – mar 2027 **89 %**	**Alta** Metas y clasificadores llegan tarde a la Formulación
Inversiones	dic 2025 – jun 2027 **47 %**	ene – ago 2027 **0 %**	ago 2027 – ene 2028 **0 %**	ago 2026 – ene 2027 **22 %**	**Alta** PMI en StandBy; formulación por proyecto desfasada
Abastecimiento	sep 2026 – may 2027 **44 %**	oct 2025 – dic 2029 **13 %**	Sin procesos	oct 2023 – jun 2026 **100 %**	**Crítica** OC/OS y Conformidad después de la ejecución del gasto
GFRH	sep 2025 – jun 2026 **100 %**	oct 2025 – sep 2026 **100 %**	Sin procesos	nov 2025 – dic 2026 **70 %**	**Baja** Concluido; la prueba integrada llega recién en 2027
Tesorería	mar 2026 – may 2028 **43 %**	jul 2026 – may 2028 **9 %**	Sin procesos	sep 2023 – ago 2026 **100 %**	**Crítica** Cuota de pago después de la Gestión de pagos
Endeudamiento	jul 2026 – ene 2027 **57 %**	dic 2026 – dic 2029 **0 %**	Sin procesos	sep 2023 – dic 2026 **97 %**	**Media** Insumos a la Formulación 10 días tarde
Contabilidad	Sin procesos	oct 2025 – sep 2028 **72 %**	mar 2026 – sep 2028 **18 %**	sep 2023 – oct 2027 **94 %**	**Alta** Cierres antes que la ejecución; motor sin actualizar desde 2028

Fechas de inicio y fin del diseño (MFD) por macroproceso; en negrita, el avance ponderado. Fuente: Cronograma AFSP – Integrado.mpp, 21/10/2026.

Cómo se conectan los macroprocesos

Tres dependencias se invierten: el receptor se diseña antes que su insumo

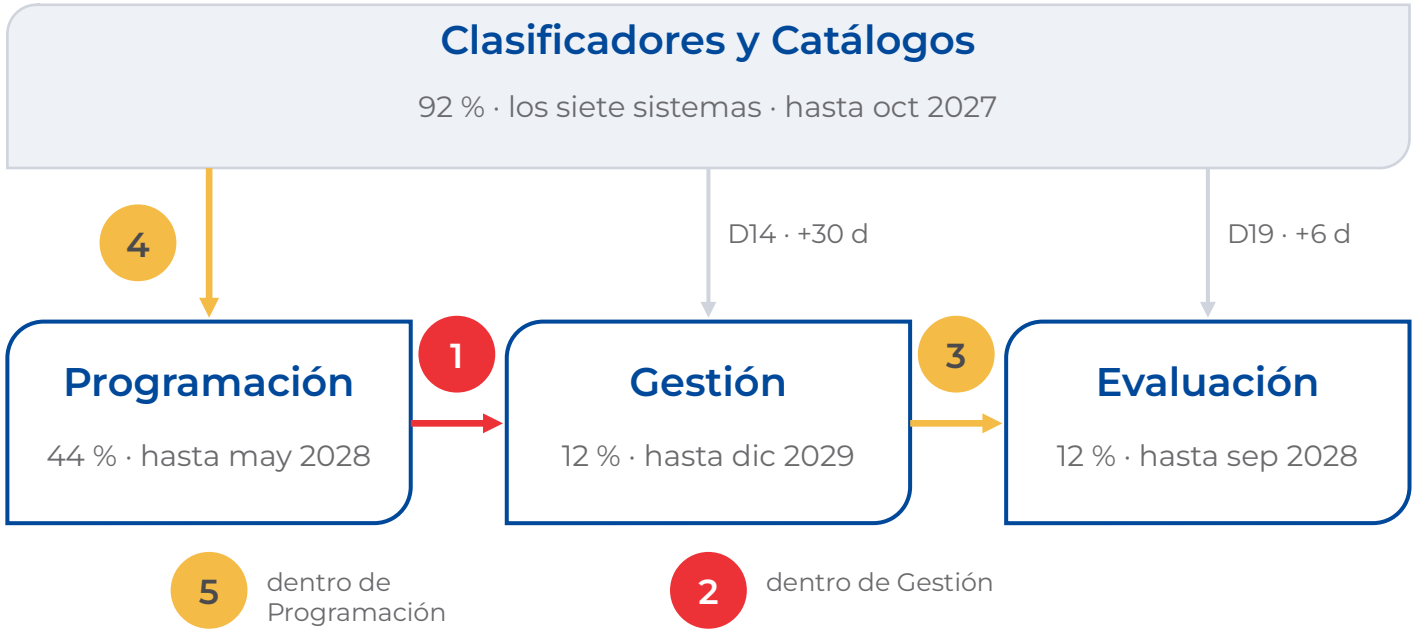

Todas las dependencias son propuestas: el .mpp no tiene vínculos registrados. Brechas en días calendario.

1. **Cuota de pago: +407 d**
   Tesorería diseña los pagos antes que la cuota
2. **OC/OS y Conformidad: +122 y +160 d**
   Abastecimiento → Presupuesto, ciclo del gasto
3. **Cierres y estados: 287 a 417 d antes**
   Contabilidad evalúa antes que la ejecución
4. **Catálogos y clasificadores: +6 a +71 d**
   Llegan después del fin de la Formulación
5. **Insumos a la Formulación: +10 a +162 d**
   De Inversiones, Presupuesto, Deuda y Tesorería

Fuente: Cronograma AFSP – Integrado.mpp, guardado el 21/10/2026. Fechas de diseño funcional (MFD).

Alerta crítica 1 · Tesorería


La cuota de pago llega 407 días después de que empieza la Gestión de pagos

ALERTA CRÍTICA

407 días

entre el inicio de la Gestión de pagos y la cuota de pago

Filas 162, 163, 232, 234 y 236 del .mpp

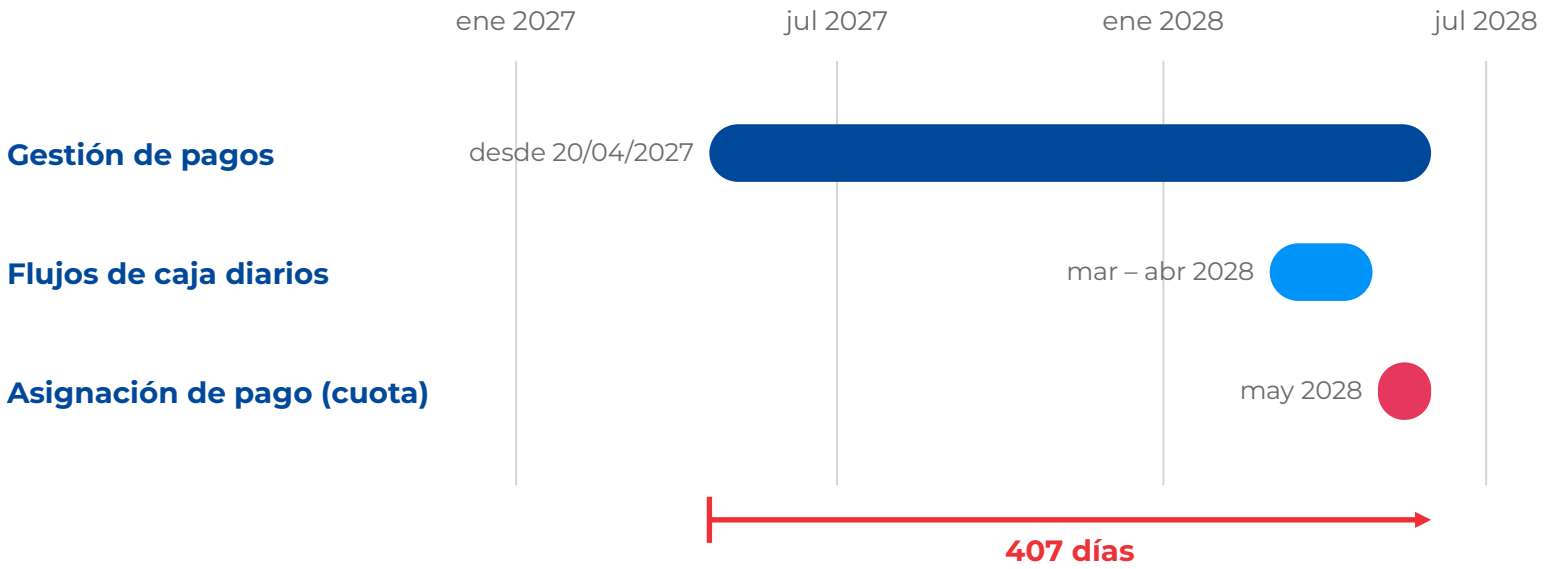

QUÉ PROPONEMOS

Adelantar los Flujos de caja diarios y la Asignación de pago a ene–abr 2027 (−422 días), o definir una cuota de pago mínima antes del 20/04/2027.

Fuente: Cronograma AFSP – Integrado.mpp, guardado el 21/10/2026. Fechas de diseño funcional (MFD).

Alerta crítica 2 · Abastecimiento y Presupuesto

El gasto en bienes y servicios se diseña antes que la orden y la conformidad

ALERTA CRÍTICA


+122 días

para la orden de compra o servicio

+160 días

para la Conformidad

Filas 181, 195, 196 y 197 del .mpp

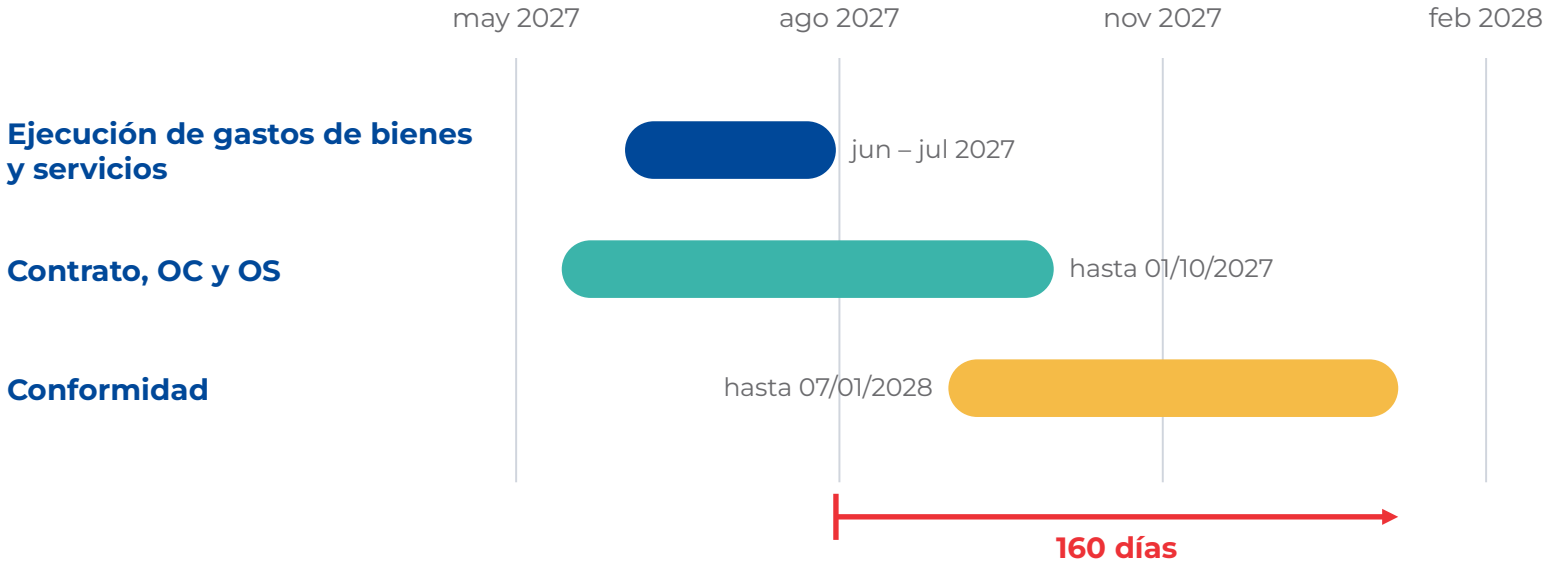

QUÉ PROPONEMOS


Dividir la Ejecución de gastos de bienes y servicios en compromiso (oct–dic 2027) y devengado (ene–mar 2028), vinculados a la OC/OS y a la Conformidad.

Fuente: Cronograma AFSP – Integrado.mpp, guardado el 21/10/2026. Fechas de diseño funcional (MFD).

Ciclo presupuestario 2027

Ocho insumos llegan después del fin de la Formulación (19/01/2027)

Días de atraso respecto del fin de la Formulación

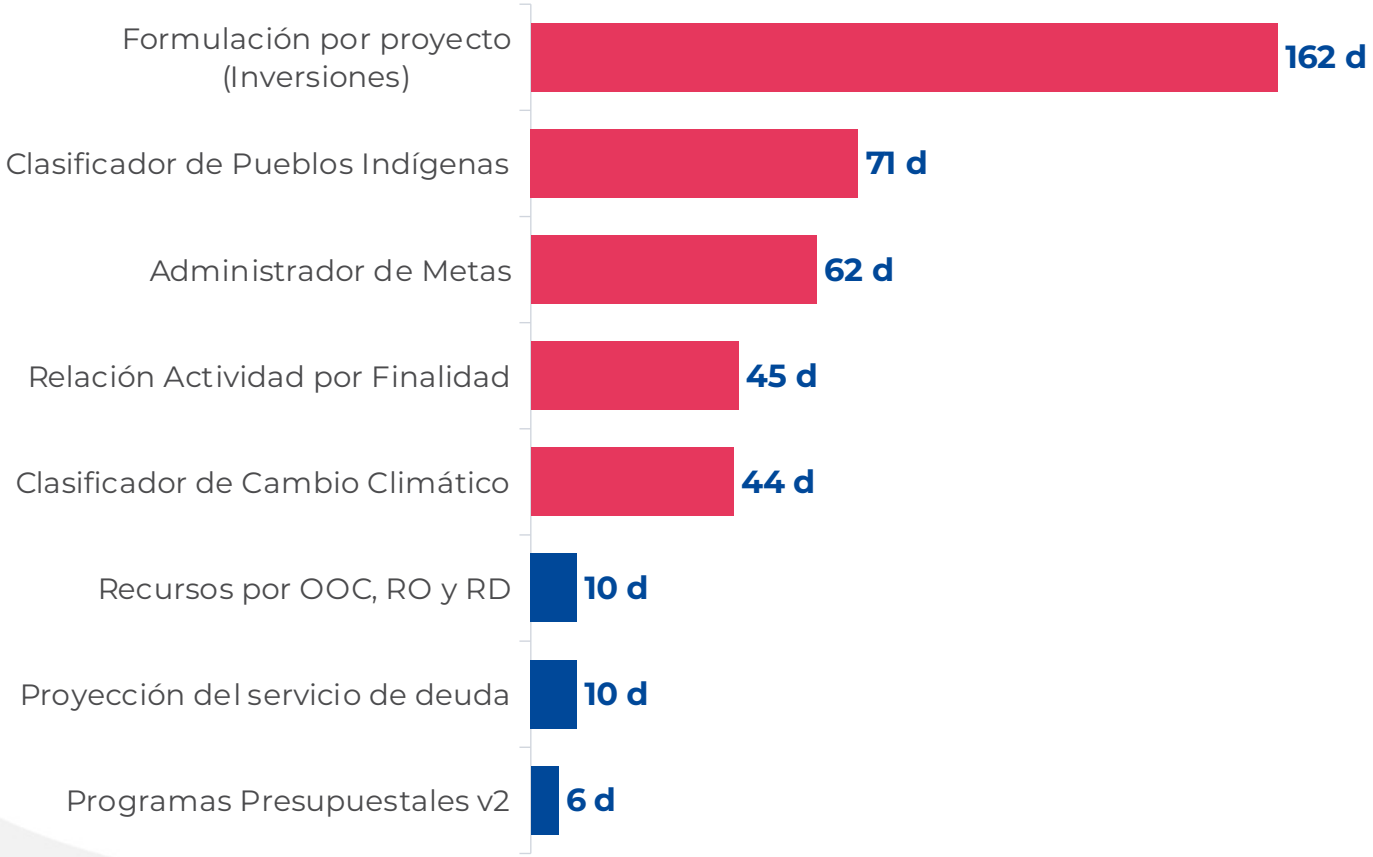

Qué hacer antes del 15/01/2027

1. **Adelantar** metas, clasificadores y catálogos v2 al 15/01/2027
2. **Entregar** una versión preliminar de deuda e ingresos al 15/01/2027
3. **Confirmar** a qué ciclo corresponde la formulación por proyecto de Inversiones
4. **Incorporar** al PMO los cinco catálogos v2 que hoy no figuran

En salmón, atrasos de 40 días o más. Fuente: Cronograma AFSP – Integrado.mpp, 21/10/2026 (dependencias D7–D10, D17 y D18).

Otras alertas altas

Contabilidad e Inversiones requieren decisiones de alcance

CONTABILIDAD
Alerta alta

Cierres y estados antes que la ejecución

Estados presupuestales y Cierre: oct 2026 – feb 2027. La Ejecución presupuestaria termina el 22/11/2027.

+287 a +417 días

Acción: Confirmar si la fuente es el SIAF-SP (viable) o el nuevo módulo (rediseño).

CONTABILIDAD
Alerta alta

Motor contable sin actualizar desde 2028

Última actualización del Catálogo de Eventos: 22/09/2028. Endeudamiento y almacén se diseñan hasta 28/12/2029.

462 días sin cobertura

Acción: Agregar una Actualización 3 del motor contable (sep–dic 2029).

INVERSIONES
Alerta alta

Programación de inversiones detenida

PMI y PMIE en StandBy al 62 %, con fin el 30/11/2026. El registro de proyectos empieza al día siguiente.

0 días de holgura

Acción: Decidir si la PMI se reactiva y a qué ciclo corresponde la formulación por proyecto.

Fuente: Cronograma AFSP – Integrado.mpp, guardado el 21/10/2026. Fechas de diseño funcional (MFD).

El cronograma aún no sirve como instrumento de control

Sin lógica de red, la integración no se puede demostrar ni seguir

0

dependencias registradas en 374 filas

304 de 307

tareas en modo de programación manual

Sin

línea base, fecha de estado ni hitos

6

tareas vencidas que siguen al 99 %

8

tareas que debieron iniciar y están en 0 %

33

actividades marcadas «No figura en PMO»

Además: la construcción del software (C3) no está programada. Las fechas miden el diseño (MFD), no la puesta en producción.

Fuente: Cronograma AFSP – Integrado.mpp, guardado el 21/10/2026. Fechas de diseño funcional (MFD).

Ajustes propuestos al cronograma

Adelantar insumos antes que retrasar receptores; el fin del 28/12/2029 no cambia

N.°	Sistema	Actividad	Hoy	Propuesta	Días	Prioridad
1	**Tesorería**	Flujos de caja diarios y cuota de pago	mar – may 2028	**ene – abr 2027**	**−422**	Alta
2	**Presupuesto**	Ejecución de bienes y servicios: compromiso y devengado	jun – jul 2027	**oct 2027 – mar 2028**	**+125 / +223**	Alta
3	**Presupuesto**	Administrador de Metas	dic 2026 – mar 2027	**oct 2026 – ene 2027**	**−66**	Alta
5	**Presupuesto**	Catálogos v2 y Relación Actividad por Finalidad	hasta mar 2027	**15/01/2027**	**−10 a −49**	Alta
6	**Contabilidad**	Estados presupuestales y cierre (si la fuente es el nuevo módulo)	oct 2026 – feb 2027	**nov 2027 – mar 2028**	**+418**	Alta
12	**Inversiones**	PMI y formulación por proyecto	StandBy	**Por decidir**	—	Alta
4	**Presupuesto**	Clasificadores de Cambio Climático y Pueblos Indígenas	hasta mar 2027	**15/01/2027**	**−48 / −75**	Media
7	**Contabilidad**	Actualización 3 del motor contable (nueva)	No existe	**sep – dic 2029**	**Nueva**	Media

Fechas calculables, pero sin verificar viabilidad: el .mpp no tiene recursos asignados. Requieren validación de los CAF y la fábrica. Detalle de los 12 ajustes en el Cuadro 5 del informe.

Decisiones que necesitamos de la UCP

Cinco decisiones de alcance y una orden técnica a la PMO

1

Cuota de pago

Aprobar su reprogramación o una versión mínima antes del 20/04/2027.

2

Gasto en bienes y servicios

Definir cómo se diseña la ejecución frente a la OC/OS y la Conformidad.

3

Fuente contable 2026–2027

Confirmar si los cierres y estados usan el SIAF-SP o el nuevo módulo.

4

Inversiones

Decidir si la PMI sale de StandBy y a qué ciclo va la formulación por proyecto.

5

Alcance PMO

Incorporar las 33 actividades fuera del PMO y fijar un titular único de convenios y acreedores.

6

Orden a la PMO

Registrar las 22 dependencias, programación automática, línea base y fechas de construcción (C3).

El informe completo (cuadros 1 a 5, 22 dependencias y 19 alertas) acompaña esta presentación.
