PERÚ | Ministerio de Economía y Finanzas

SIAF-RP
Sistema Integrado de Administración Financiera de los Recursos Públicos

RESUMEN EJECUTIVO DE LA SOLUCIÓN

Propuesta de solución y reprogramación del Cronograma Integrado AFSP

Escenario recomendado, ajustes de fechas, hitos de integración y decisiones

Dirigido a: Coordinación del Proyecto y Unidad de Coordinación del Proyecto (UCP)
Fuente: Cronograma AFSP – Integrado.mpp (21/10/2026) y Resumen Ejecutivo de Integración
Fecha: 22 de octubre de 2026

1 Situación actual

El diagnóstico se confirma en lo esencial, pero se corrige en nueve puntos antes de proponer la solución. El cronograma integrado (374 filas, corte 21/10/2026) no tiene vínculos, línea base ni fechas de construcción. Sus fechas son de diseño funcional (MFD): el fin de un MFD no es la disponibilidad del sistema construido.

Se revisaron críticamente las 22 dependencias, las 19 alertas y los 12 ajustes del diagnóstico. El resultado:

- **Dependencias:** 13 se mantienen, 9 se corrigen y aparecen 2 nuevas que el diagnóstico no vio: la certificación de crédito que necesitan las Actuaciones preparatorias (D23) y el modelo de devengado que necesita Pagos (D24).
- **Ajustes:** 3 se mantienen, 6 se modifican y 3 se retiran porque comprimían duraciones sin datos de capacidad.
- **Problemas reales de secuencia:** 10 de 24 dependencias. Las demás son solapamientos de diseño que se resuelven con entregas parciales o vínculos con desfase.

Cuadro 1. Principales correcciones al diagnóstico

Tema	Qué se corrige	Resultado
«Ciclo presupuestario 2027»	Las fechas de Formulación (14/10/2026–19/01/2027) son del diseño del MFD del módulo, no del ciclo fiscal. El riesgo es de retrabajo del MFD, no de operación del presupuesto 2027.	Se reformula como «cierre del diseño de Formulación».
Brecha de la cuota de pago (D1)	La Acreditación del responsable (232, desde 20/04/2027) no usa la cuota. El primer proceso que la necesita es Pagos entre CUT (236), desde el 16/06/2027.	La brecha pasa de 407 a 350 días.
Contabilidad antes que la ejecución (D4 y D5)	Hay evidencia de un diseño de transición con el SIAF-SP: la integración SIAF-RP–SIAF-SP (344) y el cierre contable (361) están terminados.	Se rebaja de alerta alta a «pendiente de decisión» (DEC-3).
Ajustes 3, 4 y 5 (adelantar metas, clasificadores y catálogos)	Comprimían duraciones sin datos de capacidad: el .mpp no tiene recursos.	Se retiran. Se reemplazan por entregas parciales (M3, M4) y por aplicar los clasificadores temáticos al ciclo 2028.
Ajuste 1 (adelantar 162 y 163 en 422 días)	Se solapaba con los Flujos de caja proyectados (161) y cargaba al CAF de Tesorería en el primer trimestre de 2027.	Se reemplaza por una cuota de pago v1 (N1) en mayo de 2027; la versión completa se mantiene en 2028.
Ajuste 2 (mover la ejecución de bienes y servicios hasta 223 días)	No consideraba la certificación de crédito, que las Actuaciones preparatorias necesitan antes, ni el modelo de devengado que necesita Pagos.	Se reemplaza por una división en certificación, compromiso y devengado, con entregas parciales. Aparecen dos vínculos nuevos (D23 y D24).
Ajuste 11 (adelantar los catálogos de consolidación 13 días)	Un solapamiento de 6 días es viable con un vínculo con desfase.	Se retira; se registra un vínculo FC con −5 días.

2 Solución integral recomendada

RECOMENDACIÓN

Se recomienda el **Escenario 2 – Integración optimizada**: articula los siete sistemas mediante 87 vínculos, 9 tareas nuevas y 8 entregas parciales, sin mover el fin del proyecto (28/12/2029). Las 2 alertas críticas quedan resueltas en la propuesta, condicionadas a validar la capacidad de los CAF de Tesorería y Presupuesto.

87	9 + 8	7	28/12/2029
vínculos de precedencia	tareas nuevas y entregas parciales	hitos de integración	fin del proyecto, sin cambio

La solución sigue una regla: **adelantar o dividir el insumo antes que retrasar al receptor**, y nunca comprimir una duración sin capacidad comprobada. Cuando el receptor solo necesita la estructura del dato, se crea un hito de entrega parcial en lugar de mover el proceso completo.

Cuadro 2. Solución por caso

Caso	Problema confirmado	Solución recomendada	Efecto en fechas
1 · Tesorería	Los pagos de 2027 (236, 234) se diseñan antes que la cuota de pago (163, may 2028): 350 días.	B · Cuota de pago v1 mínima (N1) con los flujos proyectados (161); 163 pasa a ser la v2 completa.	N1: 03/05/2027 – 02/06/2027. Sin retrasos.
2 · Abastecimiento – Presupuesto	Compromiso y devengado se diseñan antes que la orden (196) y la Conformidad (197); falta la certificación.	B · Dividir la ejecución en certificación y modelo de datos (N2), compromiso (181) y devengado (N3), con entregas parciales M1 y M2.	181: +31 días; N3 termina 24/12/2027.
3 · Contabilidad	Cierres y estados (355–360) se diseñan antes que la ejecución AFSP.	A · Fuente de transición SIAF-SP (ya integrada en 344) + adecuación de cierres (N5) en 2028.	Sin cambios en 2026–2027; N5: 27/12/2027 – 18/02/2028.
4 · Clasificadores y Catálogos	Formulación (144) cierra su MFD antes que metas, catálogos v2 y clasificadores temáticos.	B · Versión mínima (estructura) al 15/01/2027 (M3, M4, M8, M9); versión completa en su fecha; temáticos desde la Formulación 2028.	Sin compresiones. 6 catálogos al 99 % se cierran al 13/11/2026.
5 · Inversiones – Presupuesto	La PMI (147) está en StandBy y bloquea el registro de proyectos (149) y la formulación por proyecto (150).	A · Reactivar 147, mover 149 y crear la Formulación v2 (N4) en lugar de adelantar 150.	149: +6 días; N4: 01/07/2027 – 11/08/2027.
6 · Endeudamiento – Contabilidad	El motor contable se actualiza por última vez en sep 2028; Endeudamiento diseña hasta dic 2029.	B · Actualizaciones 3 (N6) y 4 (N7) del motor, por bloques.	N6: abr–jun 2029; N7 termina 28/12/2029 (con el proyecto).
7 · Evaluación transversal	Cuatro sistemas no tienen procesos de Evaluación.	B · Evaluar vía Presupuesto, Inversiones y Contabilidad (CGR, EFP), con una validación final (N10). No se crean módulos nuevos.	N10: oct–dic 2029.

Cuadro 3. Comparación de escenarios

Criterio	Escenario 1 – Conservador	Escenario 2 – Integración optimizada	Escenario 3 – Integración prioritaria
Fecha estimada de cierre del diseño	28/12/2029	28/12/2029	No verificable: posterior a 28/12/2029 si no se suman recursos

Criterio	Escenario 1 – Conservador	Escenario 2 – Integración optimizada	Escenario 3 – Integración prioritaria
Dependencias resueltas (de 24)	7 resueltas · 5 condicionadas · 4 pendientes de decisión · 8 sin resolver	8 resueltas · 12 condicionadas · 4 pendientes de decisión · 0 sin resolver	9 resueltas · 15 condicionadas · 0 pendientes · 0 sin resolver
Alertas críticas pendientes	2 (mitigadas solo con hitos)	0 (condicionadas a validación de capacidad)	0
Actividades reprogramadas	12 (solo actualización por avance real)	16 con cambio de fecha + 9 nuevas + 15 hitos	Más de 22 con cambio de fecha + diferimiento de procesos no críticos
Impacto en recursos	Bajo	Medio: +1 a +2 actividades simultáneas en Presupuesto (feb–abr 2027) y Tesorería (may–jun 2027)	Alto: Tesorería y Contabilidad en paralelo en 2027
Riesgo residual	Alto	Medio	Medio (bajo funcional, alto de plazo)
Viabilidad	Alta	Media-alta (condicionada)	Baja sin recursos adicionales

El Escenario 1 deja sin resolver las dos alertas críticas. El Escenario 3 resuelve más, pero exige recursos que el .mpp no permite verificar y pone en riesgo el cierre. El Escenario 2 resuelve todas las dependencias críticas con una carga adicional acotada.

3 Principales ajustes de fechas


Se modifican 16 actividades existentes y se crean 9 tareas nuevas; ninguna actividad completada cambia de fecha. Todas las fechas se calcularon con el calendario del .mpp y se verificaron contra la red de 87 vínculos: no hay conflictos ni dependencias circulares.

Cuadro 4. Ajustes principales (detalle completo en la Matriz Maestra)

ID	Sistema	Actividad	Actual	Propuesto	Variación del fin (días)	Estado
N1	Tesorería	Asignación de pago – versión mínima (cuota de pago v1 con reglas vigentes)	No existe	03/05/2027 – 02/06/2027	Nueva	**Tentativa**
N2	Presupuesto	Certificación y modelo común de datos del gasto (certificación, compromiso y devengado)	No existe	01/02/2027 – 02/04/2027	Nueva	**Tentativa**
181	Presupuesto	Compromiso de gastos de bienes, servicios y obras	01/06/2027 – 31/07/2027	30/06/2027 – 31/08/2027	+31	**Tentativa**
N3	Presupuesto	Devengado de gastos de bienes, servicios y obras	No existe	01/11/2027 – 24/12/2027	Nueva	**Tentativa**
186	Presupuesto	Ejecución de gastos de operaciones de endeudamiento	16/08/2027 – 15/10/2027	24/09/2027 – 25/11/2027	+41	**Calculada**
147	Inversiones	Elaboración de la PMI y PMIE	01/09/2026 – 30/11/2026	01/09/2026 – 04/12/2026	+4	**Pendiente de decisión**
149	Inversiones	Registro estructura del Proyecto y su relación con la Estructura Presupuestaria	01/12/2026 – 30/01/2027	07/12/2026 – 05/02/2027	+6	**Tentativa**
N4	Presupuesto	Actualización del MFD de Formulación para proyectos de inversión (Formulación v2)	No existe	01/07/2027 – 11/08/2027	Nueva	**Tentativa**
N5	Contabilidad	Adecuación de cierres y estados presupuestales a las fuentes AFSP	No existe	27/12/2027 – 18/02/2028	Nueva	**Tentativa**
N6	Contabilidad	Actualización 3 de Catálogo de Eventos y Motor de Contabilización	No existe	02/04/2029 – 01/06/2029	Nueva	**Tentativa**
N7	Contabilidad	Actualización 4 de Catálogo de Eventos y Motor de Contabilización	No existe	01/10/2029 – 28/12/2029	Nueva	**Tentativa**
N10	Contabilidad	Validación de la integración Gestión 2028–2029 con Cuenta General y Estadísticas de Finanzas Públicas	No existe	01/10/2029 – 28/12/2029	Nueva	**Tentativa**

Además: 6 catálogos vencidos al 99 % se cierran formalmente al 13/11/2026 (25, 46, 59, 60, 62 y 63), y 6 actividades que debieron empezar y siguen en 0 % inician el 02/11/2026 con su misma duración (48, 51, 81, 130, 250 y 251).

Gráfico 1. Detalle de la reprogramación

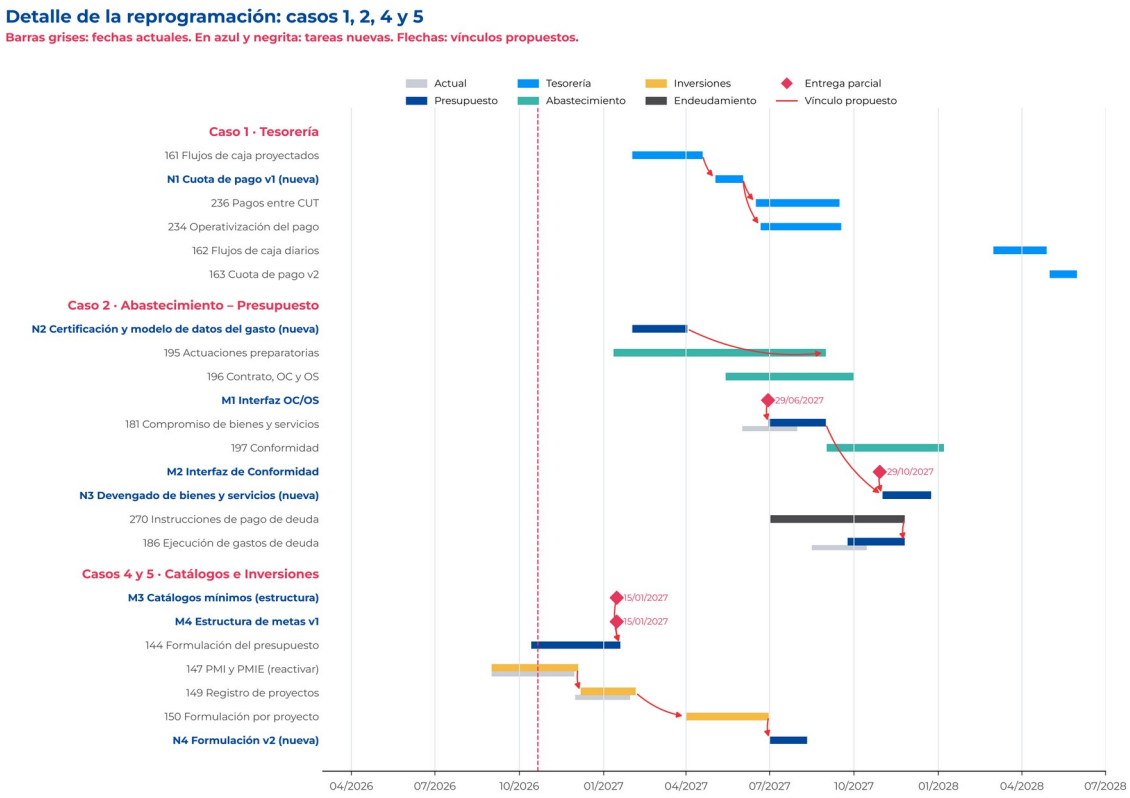

4 Hitos de integración


Siete hitos permiten comprobar que los sistemas quedan articulados, desde los catálogos (15/01/2027) hasta la integración completa (28/12/2029). Son hitos de aprobación del diseño. Los hitos de software y puesta en uso no son verificables: el .mpp no programa la construcción (C3), y se solicitará a la fábrica alinearla a estos siete hitos.

Cuadro 5. Hitos de integración del diseño funcional

Hito	Sistemas	Entregables	Fecha objetivo	Criterio de aceptación	Responsable
H1 · Clasificadores y Catálogos (versión mínima) disponibles para Programación	Presupuesto, Endeudamiento, Tesorería, Inversiones	M3 (estructura de 46, 47, 65, 66, 128–132); M5	15/01/2027	Estructuras aprobadas por la DG y cargadas en el Administrador de Catálogos (sin poblado completo)	CAF Presupuesto
H2 · Programación integrada entre sistemas	Presupuesto, Inversiones, Endeudamiento, Tesorería, Abastecimiento	138, 144, 145, 149, 153, 160, 169; M4, M8, M9	05/02/2027	MFD de Formulación con metas, deuda, ingresos y estructura de proyectos referenciados	CAF Presupuesto + Coordinación
H3 · Programación y Gestión articuladas	Presupuesto, Inversiones	173, 175, 176	31/05/2027	Apertura y cuotas de compromiso diseñadas sobre el presupuesto aprobado	CAF Presupuesto
H4 · Ciclo certificación–compromiso–devengado–pago integrado	Presupuesto, Abastecimiento, Tesorería, GFRH	N2, M1, 181, M2, N3, N1, 234, 236, M6	24/12/2027	Modelo común de datos del gasto aprobado por los cuatro CAF; trazabilidad de la orden al pago	Mesa de integración interCAF
H5 · Gestión y Contabilidad articuladas (motor contable v2)	Contabilidad y los seis sistemas de Gestión	346, 347	22/09/2028	Catálogo de Eventos con los eventos de ejecución, pagos y deuda etapa 1	CAF Contabilidad

Hito	Sistemas	Entregables	Fecha objetivo	Criterio de aceptación	Responsable
H6 · Gestión y Evaluación articuladas	Presupuesto, Inversiones, Contabilidad	363, 373, 352, N5	16/09/2028	Evaluación presupuestaria, de inversiones y Cuenta General diseñadas con las fuentes AFSP	CAF Contabilidad + CAF Presupuesto
H7 · Integración funcional completa de los siete sistemas (diseño)	Los siete	N6, N7, N10, 296	28/12/2029	Motor contable y Evaluación cubren todos los procesos diseñados hasta dic 2029	Coordinación del Proyecto

Gráfico 2. Cronograma integrado: actual frente a propuesto

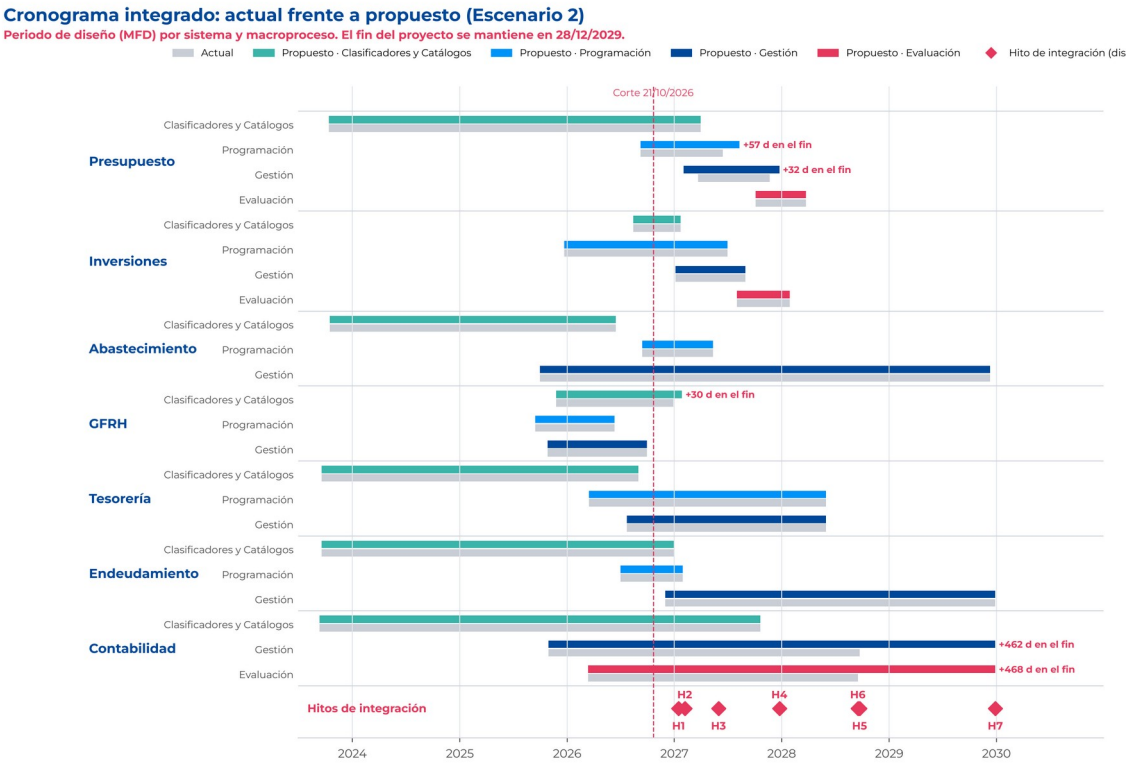

5 Riesgos residuales

De 21 hallazgos, 7 quedan resueltos en la propuesta, 9 condicionados a validación, 4 pendientes de decisión y 1 sin resolver. No se declara resuelto lo que depende de una decisión o de recursos no confirmados.

Cuadro 6. Riesgos que siguen abiertos

Hallazgo	Riesgo inicial	Solución	Riesgo residual	Estado
1 · Cuota de pago después de Pagos (Tesorería)	Crítica	Cuota v1 (N1) + v2 (163)	Media	Condicionado a validación
2 · OC/OS y Conformidad después de la ejecución (Abastecimiento–Presupuesto)	Crítica	División N2 / 181 / N3 + entregas M1 y M2	Media	Condicionado a validación
3 · Cronograma sin lógica de red	Alta	87 vínculos verificados + línea base	Baja	Condicionado a validación
4 · Cierres contables antes que la ejecución	Alta	Escenario A + adecuación N5	Media	Pendiente de decisión

Hallazgo	Riesgo inicial	Solución	Riesgo residual	Estado
5 · Motor contable sin actualizar después de 2028	Alta	Actualizaciones 3 y 4 (N6, N7)	Baja	Condicionado a validación
6 · Metas, clasificadores y catálogos v2 tarde para Formulación	Alta	Hitos M3 y M4 + DEC-6	Media	Condicionado a validación
7 · PMI en StandBy y formulación por proyecto desfasada	Alta	Reactivar 147, mover 149, Formulación v2 (N4)	Media	Pendiente de decisión
8 · Deuda e ingresos 10 días tarde para Formulación	Media	Hitos M8 y M9	Baja	Condicionado a validación
9 · Duplicidad de convenios y desembolsos	Media	Titular único (DEC-5)	Media	Pendiente de decisión
10 · 33 actividades fuera del PMO	Media	Incorporar las del ciclo del gasto (DEC-7)	Media	Pendiente de decisión
11 · Cuatro sistemas sin Evaluación	Media	Modelo transversal + validación N10	Baja	Condicionado a validación
14 · Calidad de datos del cronograma	Media	Regularización + depuración del .mpp	Baja	Condicionado a validación
Nuevo · Certificación antes de las Actuaciones preparatorias (D23)	Alta	Certificación y modelo común de datos (N2)	Media	Condicionado a validación
Nuevo · Construcción del software (C3) sin programar	Alta	Cronograma C3 alineado a H1–H7 (DEC-9)	Alta	No resuelto

Restricciones conocidas: el .mpp no tiene recursos (la capacidad de los CAF se estimó con el número de actividades simultáneas); las tareas 165 y 170 mantienen la restricción «No finalizar antes del 29/01/2027»; la carga de Presupuesto sube de 7 a 9 actividades simultáneas en febrero de 2027 y la de Tesorería de 4 a 5 en mayo de 2027.

6 Decisiones necesarias

La reprogramación necesita nueve decisiones; las cinco primeras deben tomarse antes del 15/12/2026. La matriz completa, con alternativas y consecuencias, está en el Entregable 4 (hoja «Decisiones» del Excel).

Cuadro 7. Decisiones para la Coordinación y la UCP

Código	Decisión	Alternativa recomendada	Si no se decide	Responsable	Fecha límite
DEC-4	Salida de StandBy de la PMI y PMIE	A: reactivar ya (+6 d en 149)	Presupuesto y Endeudamiento no tendrán estructura de proyectos para 2027.	Coordinación del Proyecto	30/10/2026
DEC-3	Fuente contable de transición 2026–2027	A: SIAF-SP vigente + adecuación N5	Riesgo de rediseñar cierres y estados, y de desplazar la Cuenta General.	CAF Contabilidad → Coordinación	30/11/2026
DEC-5	Titularidad de convenios, desembolsos y acreedores	A: Endeudamiento titular; Inversiones consume y vincula al proyecto	Doble registro de convenios y datos inconsistentes entre sistemas.	Tres CAF → Coordinación	30/11/2026
DEC-6	Ciclo de aplicación de los clasificadores temáticos	B: aplicarlos desde la Formulación 2028	Presión para comprimir dos MFD sin capacidad verificada.	CAF Presupuesto	30/11/2026
DEC-9	Política de programación y construcción (C3)	B: automático solo con vínculos validados + línea base + cronograma C3	El cronograma seguirá sin ruta crítica y sin fechas de puesta en uso.	Coordinación + PMO + OGTI	04/12/2026

Código	Decisión	Alternativa recomendada	Si no se decide	Responsable	Fecha límite
DEC-1	Cuota de pago para los pagos de 2027	B: cuota v1 mínima en may 2027 + v2 en 2028	Los MFD de pagos se cierran sin la regla de cuota: retrabajo y ciclo de pago no probable en 2027.	CAF Tesorería → Coordinación	15/12/2026
DEC-2	División de la ejecución de bienes y servicios	B: dividir 181 con entregas parciales M1 y M2	El gasto corriente se diseña sin su documento fuente; la certificación sigue sin diseño propio.	CAF Presupuesto + CAF Abastecimiento → Coordinación	15/12/2026
DEC-7	Alcance de las 33 actividades «No figura en PMO»	B: incorporar las del ciclo del gasto (181–187, 232–237) y evaluar el resto	El ciclo del gasto quedaría sin presupuesto ni prioridad en la fábrica.	UCP	15/12/2026
DEC-8	Modelo de Evaluación transversal	B: evaluar vía Presupuesto, Inversiones y Contabilidad + validación N10	Ambigüedad de alcance y posibles módulos redundantes.	Coordinación del Proyecto	31/01/2027

7 Conclusión sobre la viabilidad

La integración funcional de los siete sistemas es viable dentro del plazo actual (28/12/2029), con el Escenario 2 y bajo cuatro condiciones.

1. **Decidir a tiempo:** reactivar la PMI (DEC-4, 30/10/2026) y confirmar la fuente contable de transición (DEC-3, 30/11/2026).
2. **Confirmar capacidad:** el CAF de Tesorería para la cuota de pago v1 (may 2027) y el CAF de Presupuesto para la certificación y el modelo común de datos (feb–abr 2027).
3. **Formalizar la red en Microsoft Project:** cargar los 87 vínculos, las tareas nuevas y los hitos; guardar la línea base 1 antes del 04/12/2026.
4. **Programar la construcción (C3):** sin ella, los hitos de software y la puesta en uso no pueden verificarse.

Si estas condiciones no se cumplen, el proyecto mantiene sus fechas, pero vuelve al riesgo del Escenario 1: dos ciclos críticos (pago y gasto en bienes y servicios) diseñados sin sus insumos.

Entregables que acompañan este resumen: Matriz Maestra de Reprogramación (Excel con 11 hojas y filtros), cronograma propuesto en formato XML de Microsoft Project (el .mpp original no fue modificado) y los gráficos del cronograma integrado.
